

Riskiratatyöilmoitus

Riskiratatyöilmoitusten (RR-ilmoitus) tavoitteena on

- 1. Tunnistaa ratatyöt, joissa on tunnistettu suunnitteluvaiheen jälkeen riski työn viivästymiseen sekä
- 2. arvioida karkealla tasolla millaisia suoria vaikutuksia liikennöintiin viivästymisellä olisi.

Riskiratatyöilmoituksesta saadun tilannekuvan perusteella radanpidon urakoitsijat, Väylävirasto, rautatieyrietykset ja Fintraffic Raide voivat pyrkiä ennaltaehkäisemään ja ennalta varautumaan mahdollisiin häiriötilanteisiin. Kukin toimija ohjeistaa itsenäisesti kenen työtehtäviin kuuluu osallistua riskiratatyöilmoitusten laadintaprosessiin ja hyödyntämiseen.

Sisällysluettelo

Listanäkymä.....	1
Riskiratatyöilmoitus.....	2
Tietojen syöttäminen ja tallentaminen.....	2
Riskiratatyön ”tila”-tiedot:	3
Riskiratatyöt RUMA-kartalla	4
Sähköpostitilaukset.....	5

Listanäkymä

Valitse Riskiratatyöt RUMA-sovelluksen yläpalkista. Valinta avaa riskiratatoistä listanäkymän.

Löydät vanhat ilmoitukset arkistosta

Suodata ilmoituksen tilan perusteella

Suodata ilmoituksia jotka sisältävät työraon annettun aikavälin sisällä

Aloita uuden riskiratatyöilmoituksen luominen

Luo uusi riskinosto

Riskiratatyöilmoitukset

Nykyiset

Arkisto

Omat

Väylävirasto

Kaikki

Tila: Kaikki

Lisäalue

Kunnossapitoalue

Päivä tai -väli

Haku

ID	Tila	Ennakkoilmoitus	Työraot	Hanke/Projekti	Sijainti	Viivästymisen todennäköisyys	Ketjuuntumisen vaikutukset
114	Vaikutusarvio kesken	E1158354	to 21.03.2024 21:30 - pe 22.03.2024 04:00	Hanke 1	Hyvinkää - (hummela)	Korkea	Kohtalaiset

Avaa ennakkoilmoitus JETissä

Avaa ilmoitus katselu-/muokkausnäkymässä

Riskiratatyöilmoitus

Valmis riskiratatyöilmoitus koostuu viidestä osasta:

1. **Ennakoilmoitus.** Riskiratatyöilmoituksen pohjana on ratatyöstä laadittu ennakoilmoitus.
Ennakoilmoitus voi olla tyypiltään:
 - Suljettu liikennöinniltä
 - Suljettu sähköjunaliikenteeltä
 - Liikenteen ehdoilla
2. **Riskinosto.** Riskinoston luominen aloittaa riskiratatyöilmoituksen laadinnan prosessin. Nosto tehdään niistä ratatöistä, joissa on kohonnut myöhästymisriski.
3. **Riskiarvio.** Tässä vaiheessa tunnistetaan ratatyöhön liittyviä riskejä ja riskien hallintakeinoja. Samalla arvioidaan ratatyön viivästymisen todennäköisyyttä ja sitä, voidaanko myöhästymisen tapahduttua liikennöidä rajoitetusti.
4. **Liikennevaikutusarvio.** Kun riskiarvio on tehty, riskiratatyölle tehdään liikennevaikutusarvio. Siinä arvioidaan ketjuuntumisen vaikutusten laajuutta ja vaikutuksia yksittäisiin juniin.
5. **Kommentit.** Riskiratatyöilmoituksen kommenttikenttään voi kirjata lisätietoja, joille ei ole sopivaa lomakekenttää. Kommenteissa voi kommentoida myös aiempia kommentteja.

Riskiratatyöilmoitus 101

Vaikutusarvio kesken

Ennakoilmoitus

E1158357  Suljettu liikennöinniltä
Nummela - Kirkniemi
Sähköratatyöt.

> Ennakoilmoituksen kohteet

> Ennakoilmoituksen työraot [1]

> Riskinosto

> Riskiarvio

> Liikennevaikutusarvio

> Kommentit [0]

1. Ennakoilmoitus

2. Riskinosto

3. Riskiarvio

4. Liikennevaikutusarvio

5. Kommentit

Riskiratatyöilmoituksessa on viisi osaa, ja ilmoitus laaditaan kommentointia lukuun ottamatta osien mukaisessa järjestyksessä. Kommentin voi kirjata milloin vain.

Tietojen syöttäminen ja tallentaminen

Punaisella tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. Suunnitelman voi tallentaa ennen lähettämistä niin monta kertaa kuin haluaa. Riskiratatyöilmoitukselle tulee silloin tilaksi "Kesken". Kun kaikki pakolliset tiedot on täytetty ja ilmoitus on lähetetty, ilmoitukselle tulee tilaksi "Valmis". Seuraavan vaiheen voi aloittaa tämän jälkeen.

Riskiratatyön ”tila”-tiedot:


Riskiratatyöilmoituksella voi olla seitsemän erilaista tilatietoa:

1. Riskinosto kesken
2. Riskinosto valmis
3. Riskiarvio kesken
4. Riskiarvio valmis
5. Vaikutusarvio kesken
6. Vaikutusarvio valmis
7. Käsitelty

”Kesken” tilassa kyseisen vaiheen lomaketietoja voi muokata vapaasti. Lähettäminen sulkee tuon vaiheen, eivätkä tiedot ole enää sen jälkeen muokattavissa.

Jos riskiratatyöilmoituksen laadinnassa on tehty vääriä kirjauksia, voit poistaa koko ilmoituksen painamalla ”Poista” komentoa. Jos ilmoituksesta on virheellisesti aloitettu seuraava vaihe, voit palata edelliseen vaiheeseen painamalla ”Palauta riskinostoksi” tai ”Palauta riskiarvioksi” komentoa. Versiohistoriasta näkee, missä vaiheessa ilmoituksen tekeminen on ja milloin ilmoitusta on muokattu.

Jos ilmoituksen tekeminen on ”kesken” tilassa, työstäminen on lukittu vaiheen aloittaneelle käyttäjälle. Tämä estää sen, että ilmoitusta voitaisiin työstää yhtä aikaa. Ilmoituksen voi kuitenkin kaapata itselleen, jolloin myös toinen käyttäjä voi täyttää sen loppuun ja lähettää eteenpäin.

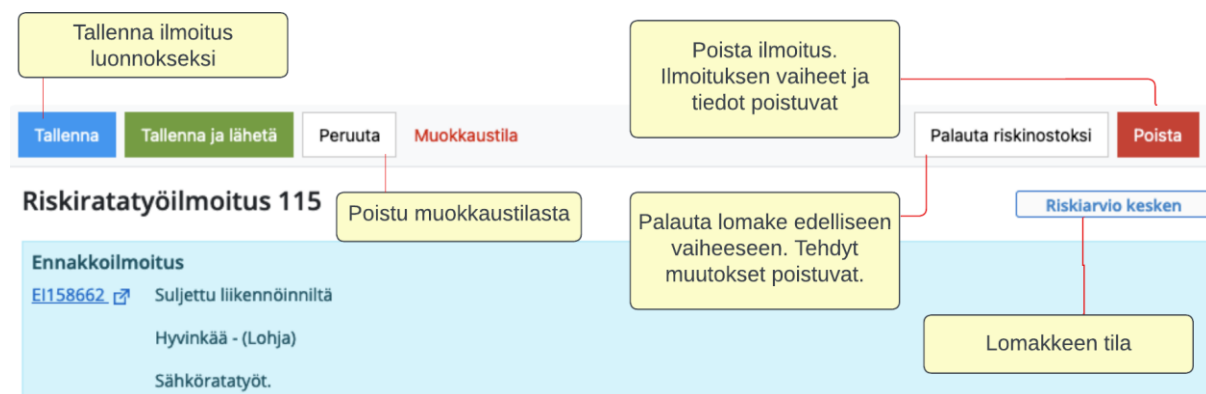

Riskiratatyöilmoitus tehdään kolmessa vaiheessa. ”Tallenna” komento jättää vaiheen luonnostilaan, jota voi muokata.” Tallenna ja lähetä” komento lukitsee kyseisen vaiheen, eikä sinä voi enää muokata. ”Palauta” toiminto on mahdollista tehdä vain kesken eli luonnostilaan jääneeseen vaiheeseen. ”Poista” poistaa koko riskiratatyöilmoituksen ja kaikki sen tiedot.

Kaappaa ilmoitus

⚠️ Toinen käyttäjä on ottanut ilmoituksen käsittelyyn. Tarvittaessa voit kaapata ilmoituksen itsellesi.

Riskiratatyöilmoitus 122

Riskinosto

Käyttäjä, jolla on oikeudet tietyn riskiratatyöilmoituksen vaiheen tekemiseen, voi tarvittaessa kaapata kesken jääneen vaiheen työstön itselleen.

Riskiratatyöt RUMA-kartalla

Riskiratatyötä voi tarkastella myös RUMA-kartalla. Ilmoituksen sijainti on sama kuin ilmoitukseen liitetyn ennakoilmoituksen sijainti.

1. Avaa RUMA-kartalla
Näytä kartalla -valikko

2. Valitse riskiratatyöt

☐ Ennakoilmoitukset

☐ Suljettu liikennöinniltä

☐ Näytä myös listana

☐ Suljettu sähköjunaliikenteeltä

☐ Kapasiteettivaraus

☐ Kaluston säilytyksen kapasiteettivaraus

☐ Nopeusrajoitus

☐ Alentunut tehonsyöttökyky

☐ Liikenteen ehdoilla

☐ Muu ilmoitus

☐ Sisältää jännitekatkoja

☐ Ennakkosuunnitelmat

☐ Suljettu liikennöinniltä

☐ Suljettu sähköjunaliikenteeltä

☐ Nopeusrajoitus

☐ Alentunut tehonsyöttökyky

☐ Liikenteen ehdoilla

☐ Vuosisuunnitelmat

☐ Liikennejärjestelyä vaativa

☐ Mahdollinen liikennejärjestelyä vaativa

☐ Ei liikennehaittaa, tehdään liikenteen ehdoilla

☐ Ei liikennehaittaa, tehdään ilman työlupia

☐ Näytä vain aktiiviset

☐ LR-ilmoitukset

☐ Suljettu liikennöinniltä

☐ Suljettu sähköjunaliikenteeltä

☐ Tilapäinen nopeusrajoitus

☐ Tullityön vaara-alue

☐ Akselipaino max

☐ JKV-rakennusalue

☐ Vaihteen lukitus

☐ Muu

☐ RT-ilmoitukset

☐ Aktiiviset

☐ Passiiviset

☐ Lähetetyt

☐ Ratatööluvut

☐ Aktiiviset luvat

☐ JK-ilmoitukset

☐ Käynnissä

☐ Hyväksytty

☐ Kesken

☐ Muistiinpanot

☐ Ei näytetä

☐ Omat

☐ Kaikki


☐ Liikenneturvallisuuksuunnitelmat

☐ Hyväksytty

☒ Riskiratatyöt

☒ Riskiratatyöt

Riskiratatyöt saa näkyviin "Näytä kartalla" -painikkeen kautta aukeavan suodatusikkunan avulla.

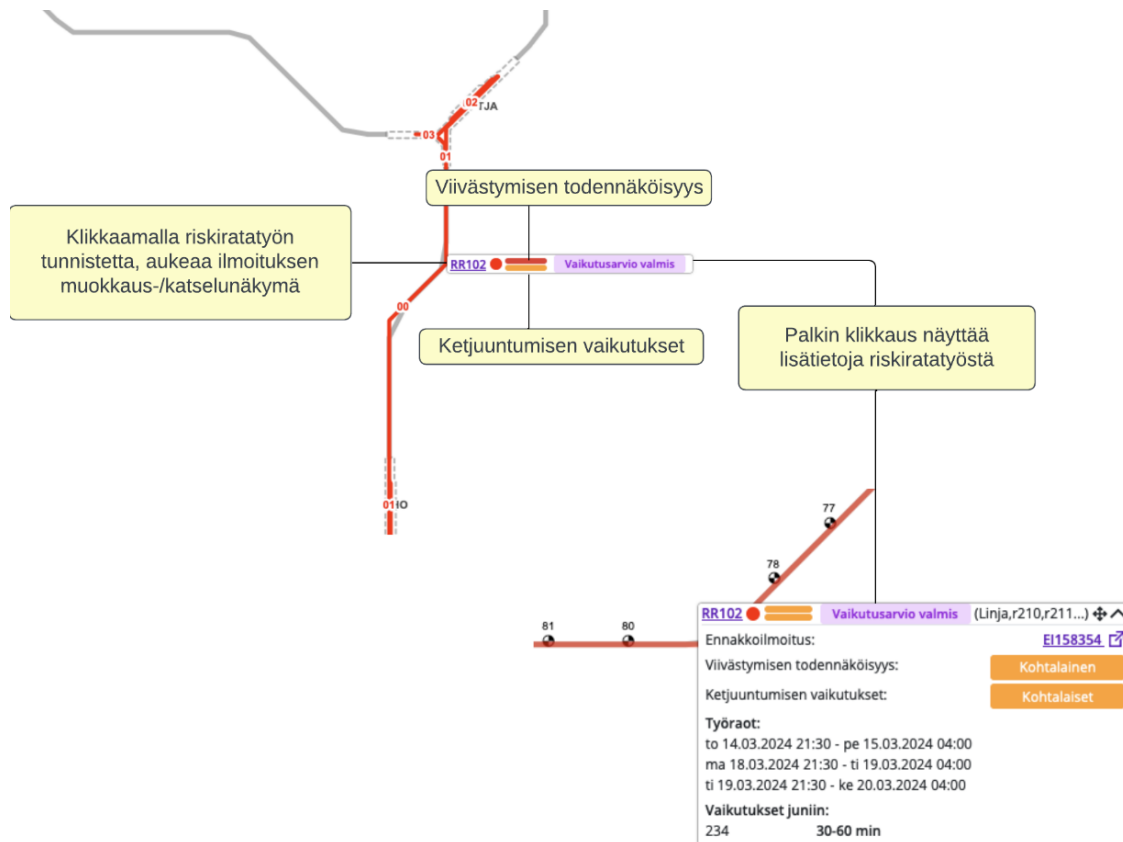

Karttanäkymä tarjoaa nopean silmäyksen riskiratatyöiden maantieteelliseen sijoittumiseen. Palkin tiedoista näkee mm. värikoodien kautta viivästymisen todennäköisyyden ja ketjuuntumisen vaikutukset.

Sähköpostitilaukset

Riskiratatyöilmoituksista voi tilata itselleen sähköpostikoosteen. Kooste saapuu sunnuntai iltaisin, ja sinne on listattu kaikki kokonaan valmiit riskiratatyöilmoitukset. Koosteen voi tilata kuka tahansa RUMA-käyttäjä. Liikennevaikutusten arvioijat voivat tilata tämän lisäksi reaaliaikaisen sähköpostiviestin myös tehdyistä riskiarvioista. Tilaukset voi tehdä RUMAn yläpalkin kautta löytyvästä linkistä.

Tallenna tilaukset

Peru muutokset

Lähetä testikoosteviesti

Sähköposti-tilaukset

Tallenna valitut tilaukset

Tilaus 1

Sähköpostiosoite*

Liikennepaikat/-välit

Kytkentäryhmät

Kunnossapitoalueet

Otsikko ⓘ

Jännitekatkot

Jännitekatkon hyväksyntä

tiina.tilaaja@riskirata.fi ⓘ

Hae tai valitse kartalta

Hae tai valitse kartalta

Kunnossapitoalue ▾

Riskiratatyöilmoituksia voi rajata liikennepaikkojen/-välien, sekä kunnossapitoaluiden mukaan. Jos maantieteellistä rajausta ei ole valittuna, tilaus kattaa kaikki ilmoitukset

Liikenneturvallisuuksuunnitelmat

Liikenneturvallisuuksukooste ⓘ

Riskiratatyöilmoitukset

Riskiratatyöilmoitus -kooste ⓘ

Ei ▾

Ei ▾

Tilaa sunnuntai-iltaisin saapuva kooste valmiista liikennevaikutusten arvioista seuraavalta kolmelta viikolta.

Poista tilaus
